# 東御市横堰小水力発電所事業性評価調査事業

## 1. 事業の目的

本事業は長野県東御市新張地点において、農業用水から農業ため池に至る導水管を利用した小水力発電事業の推進のために必要な地形測量、地質調査、基本設計を実施し、事業性評価を行う事を目的とする。

## 2. 事業の内容

- (1) 事業者名
  - 株式会社 高見澤
- (2) 補助事業の名称 東御市横堰小水力発電所事業性評価調査事業
- (3) 事業期間
  - 令和4年10月24日 ~ 令和5年2月20日
- (4) 調査を実施する発電設備の概要
  - a.発電形式 : 流れ込み式 b.使用水量 : 0.18 ㎡/s c.有効落差 : 16.10m d.出 カ : 21.0kW

#### 3. 令和4年度の事業実施概要

- 地形測量
  - 現状の地形を把握するため平面、縦断、横断の地形測量を行なった。
- ② 地質調査
  - 建設予定地周辺においてスウェーデン式サウンディング試験による地質調査を行った。
- ③ 基本設計

調査結果を踏まえ流量資料整備、発電基本計画の検討、水車発電機形式の選定、有効落差及び電力量の計算、電気設備の概略設計、概算工事費の積算、概略設計図の作成、及び事業性評価を行なった。




写真:地形測量作業



写真:地質調査作業

#### 4. 事業の成果等

基本設計に基づき機器費、工事費、売電収入を考慮して事業採算性を検討した。また初期投資回収年数、IRRから事業性評価を行った結果、事業性があると判断したが、事業化のためには、コストダウン策の検討が必要となる。

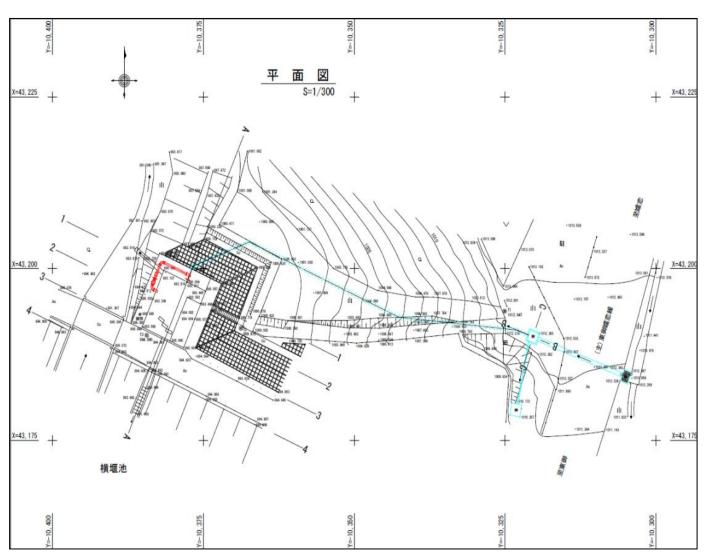

#### 5. 事業スケジュール

項目	計画	2022/12			2023/1			2023/2			2023/3		
	実績	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
調査開始日	実績			2022年1	2月21日原	開始							
基礎資料収集・整理	計画												
	実績												
地形測量	計画												
	実績												
地質調査	計画												
	実績												
前提条件整理	計画												
	実績												
基本設計	計画												
	実績												
事業性評価	計画												
	実績												
調査完了日	実績									2023年2月13日完了			
